
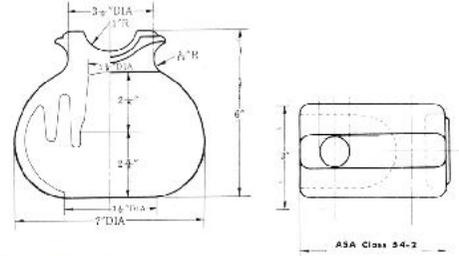



# 檢驗記錄報告表

## 裝腳礙子



## 防鹽裝腳礙子

## 拉線礙子



## 茶台

## 懸垂礙子



15

品名	絕緣礙子4*6 (55-3)				圖號	購號			
檢驗日期	99.06.25				數量	407支	抽樣數	30支	
尺寸構造(依圖示全數)					電氣試驗		物理(破壞)試驗		
	122+3 -3	88+2 -2	57 +2 0	62+1 -1	28+1 -1	衝擊波電壓 規格	結果	抗彎強度 規格	結果
1	122	87	57	62	28	95KV	合格		
2	121	89	58	62	29	95KV	合格		
3	122	88	57	63	28	95KV	合格		
4	122	87	57	62	28	95KV	合格		
5	121	89	58	62	29	95KV	合格		
6	122	88	57	63	28	95KV	合格		
7	123	88	57	62	28	乾燥耐壓 1分鐘		端子扭力試驗	
8	122	87	57	62	28	規格	結果	規格	結果
9	122	88	57	61	28	35KV	合格		
10	122	88	57	62	28	35KV	合格		
11	122	88	57	63	28	35KV	合格		
12	121	89	58	62	29	35KV	合格		
13	122	88	57	63	28	35KV	合格		
14	123	88	57	62	28	35KV	合格		
15	122	87	57	62	28	注水耐壓 10秒		剝離力試驗	
16	122	88	57	61	28	規格	結果	規格	結果
17	122	88	57	62	28	30KV	合格		
18	122	88	57	63	28	30KV	合格		
19	122	87	57	62	28	30KV	合格		
20	121	89	58	62	29	30KV	合格		
21	122	88	57	63	28	30KV	合格		
22	122	87	57	62	28	30KV	合格		
23	121	89	58	62	29	高週波試驗200KHZ/3秒		合格	
24	122	88	57	63	28	絕緣電阻2000M以上		合格	
25	123	88	57	62	28	吸濕試驗 280kg/cm2		合格	
26	122	88	57	62	28	保持5小時以上			
27	122	88	57	63	28	冷熱試驗溫差90度C			
28	122	87	57	62	28	以上試驗10回		合格	
29	122	87	57	62	28	外觀依據 TPC B003		合格	
30	122	87	57	62	28	實施全數檢查			

出廠檢驗合格證明



- 1.隨貨附上
- 2.未蓋合格章不得出廠
- 3.備註

課長 林國光	檢驗者 呂保部 羅仁志 許寶國
-----------	--------------------------

執行機構: 自然電科技股份有限公司 www.npr89.com	設計公司: 自然電科技股份有限公司 www.npr89.com	監製公司:
檢驗日期:	檢驗單號:	日期 (DATE):
檢驗地點:	檢驗主管:	審核 (APPROVED BY):
檢驗主任:	檢驗主任:	審核 (APPROVED BY):
檢驗課長:	檢驗課長:	電檢 (ELECTRICAL):
檢驗人員:	檢驗人員:	土木 (CIVIL):
	圖面名稱: 11KV絕緣礙子+裝腳55-3(4*6)	景觀 (LANDSCAPE):
	DRAWING TITLE:	製圖 (DRAWING):
